

新環境クリーンセンター建設工事 NEWS

この「新環境クリーンセンター建設工事NEWS」では、
定期的にごみ処理場の建設工事に関する情報をお届けします。

第3号

2018年1月
富士市 環境部
新環境クリーンセンター建設課
0545-55-2918

敷地造成工事が進み、工場棟建築工事の準備が始まります

7月から開始した敷地造成に関わる工事が順調に進捗しています。井戸の掘削工事が完了し、撤去工事も概ね完了しましたので、1月からは、本格的な工場棟建築の準備として、場内仮設道路の整備、仮設事務所の建替え、施工図作成などを行います。


6ヶ月工事工程



さく井工事の様子

井戸の掘削が完了しました

9月下旬より開始したさく井工事は、予定していたとおり、深さ150mの掘削が完了しました。

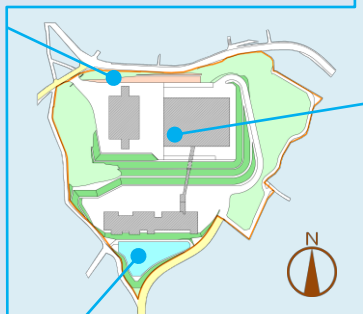

樹木や構造物の撤去が終わりました

敷地内にある、茶の木などの樹木や、不用となる用水路などの構造物の撤去が概ね完了しました。



現況（1月上旬）



雨水調整池工事の様子

雨水調整池の工事をしています

雨水調整池設置部の土掘削・岩掘削が終わり、池の底・壁をコンクリートで作っています。コンクリート運搬車両は、最大30台/日を使用する予定です。

工事中の環境影響に配慮しています

環境測定をしています

定期的に工事中の騒音、振動、大気質、排出水の調査を行うことで、周辺への影響を確認しています。



環境監視状況

環境測定の結果は定期的に環境監視委員会に報告

市では、工事の状況や環境測定の結果を、地元である青葉台地区、大淵地区合同で設置していただいた「環境監視委員会」に報告しています。2017年10月18日（水）には、環境監視委員会の皆様に、現地の状況を確認していただきました。現地では測定器を用いて、直接環境測定の数値を確認していただくとともに、調整池の岩盤掘削時の音を体感していただきました。



環境監視委員会による現地確認
